

# IDEAV SAS

<b>Progetto:</b>	<b>CLIENTE IMPIANTO COMMERCIALE (Roma)</b>				
<b>Weekly Report n°:</b>	<b>2</b>	<b>N°Settimana</b>	<b>2</b>	<b>Data:</b>	<b>18/05/2013</b>

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
F.P.O della tubazione della montante che unisce le due dorsali al locale tecnico	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale perimetrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale centrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione relativa alle derivazioni a parete comprensiva di scatole porta frutto	100%		
F.P.O. la corrugati sotto traccia	100%		
Passaggio cavi elettrico	95%	13 Maggio	21 Maggio
Passaggio cavi dati	60%	13 Maggio	21 Maggio
Passaggio cavi rivelazione fumi e automazione	0%	21 Maggio	23 Maggio
Cablaggio scatole elettrico	40%	22 Maggio	22 Maggio
Installazione frutti Bticino e montaggio luci	0%	22 Maggio	28 Maggio
Cablaggio quadri elettrici e attestazione linee	0%	28 Maggio	29 Maggio
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	0%	28 Maggio	30 Maggio
Certificazione impianto rete dati	0%	31 Maggio	31 Maggio
Installazione impianti rivelazione fumi	0%	1 Giugno	3 Giugno
controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	0%	7 Giugno	7 Giugno

# IDEAV SAS

<b>OPERE EXTRA</b>	
1	Verifica linee elettriche e citofoniche condominio, zona corridoio ingresso con fornitura e posa in opera tubazione e nuovo collegamento.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS

## SALA PROIEZIONI




# IDEAV SAS

## CUCINA



# IDEAV SAS

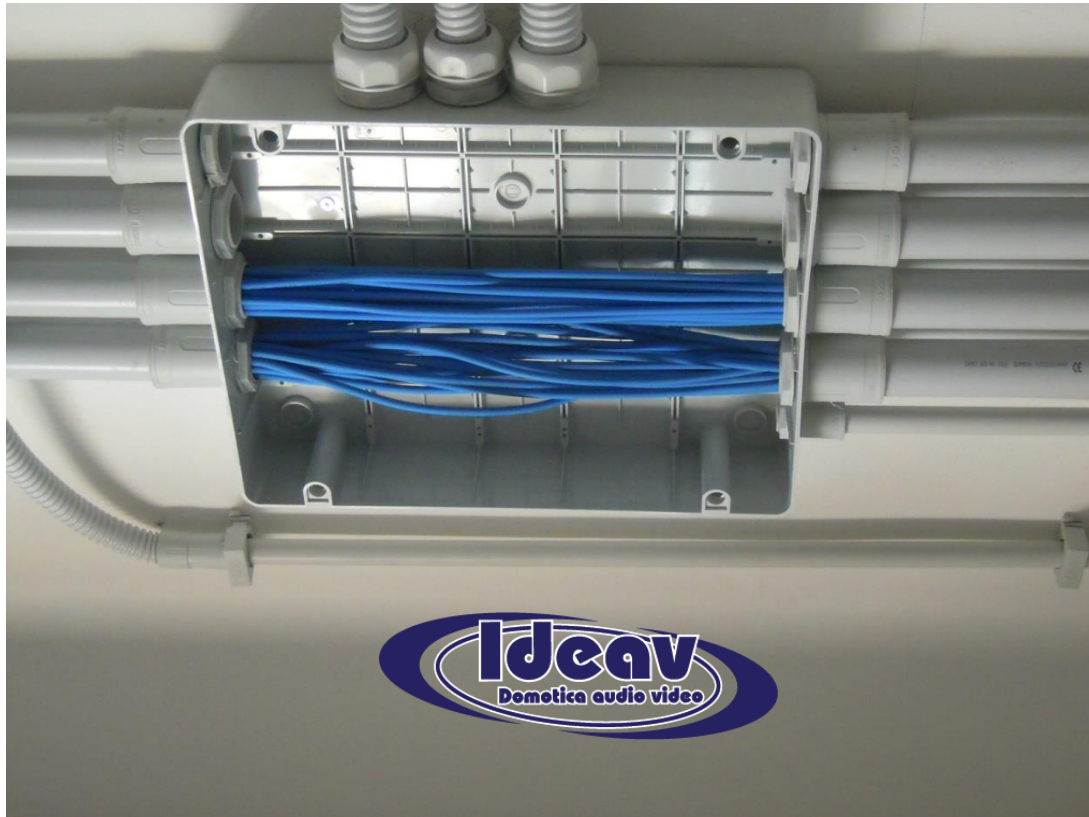

# IDEAV SAS





# IDEAV SAS



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV sas							
Operaio 1	10	10	10	10	10	10	
Operaio 2	10	10	10	10	10	10	
Operaio 3	10	8	10	10	8	6	
Operaio 4	10	10	10	10	9	10	
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	

NOTE	
------	--
