

IDEAV SAS


Progetto:	CLIENTE IMPIANTO RESIDENZIALE (Roma)				
Weekly Report n°:	3	N° Settimana	3	Data:	20/06/2013

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
Fornitura e posa in opera corrugati zona Daniele	100%		
Fornitura e posa in opera corrugati zona Sig.ra Danieli	100%		
Passaggio cavi impianto elettrico	70%		25 Giugno
Passaggio cavi di tipo speciale (tv, telefono, sicurezza audio-video)	15%		25 Giugno
Cablaggio scatole impianto elettrico	20%		25 Giugno
Fornitura ed installazione frutti	0%		
Cablaggio quadri elettrico e attestazione linee	0%		
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	0%		
Cablaggio ed installazione impianto di sicurezza	0%		
Montaggio corpi illuminanti	0%		
Controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	0%		

NOTE:

Come da accordi presi in cantiere la serie civile nella zona 1 sarà della Bticino Axolute colore grigio chiaro e nella zona 2 sarà della Bticino Axolute colore bianca.

IDEAV SAS

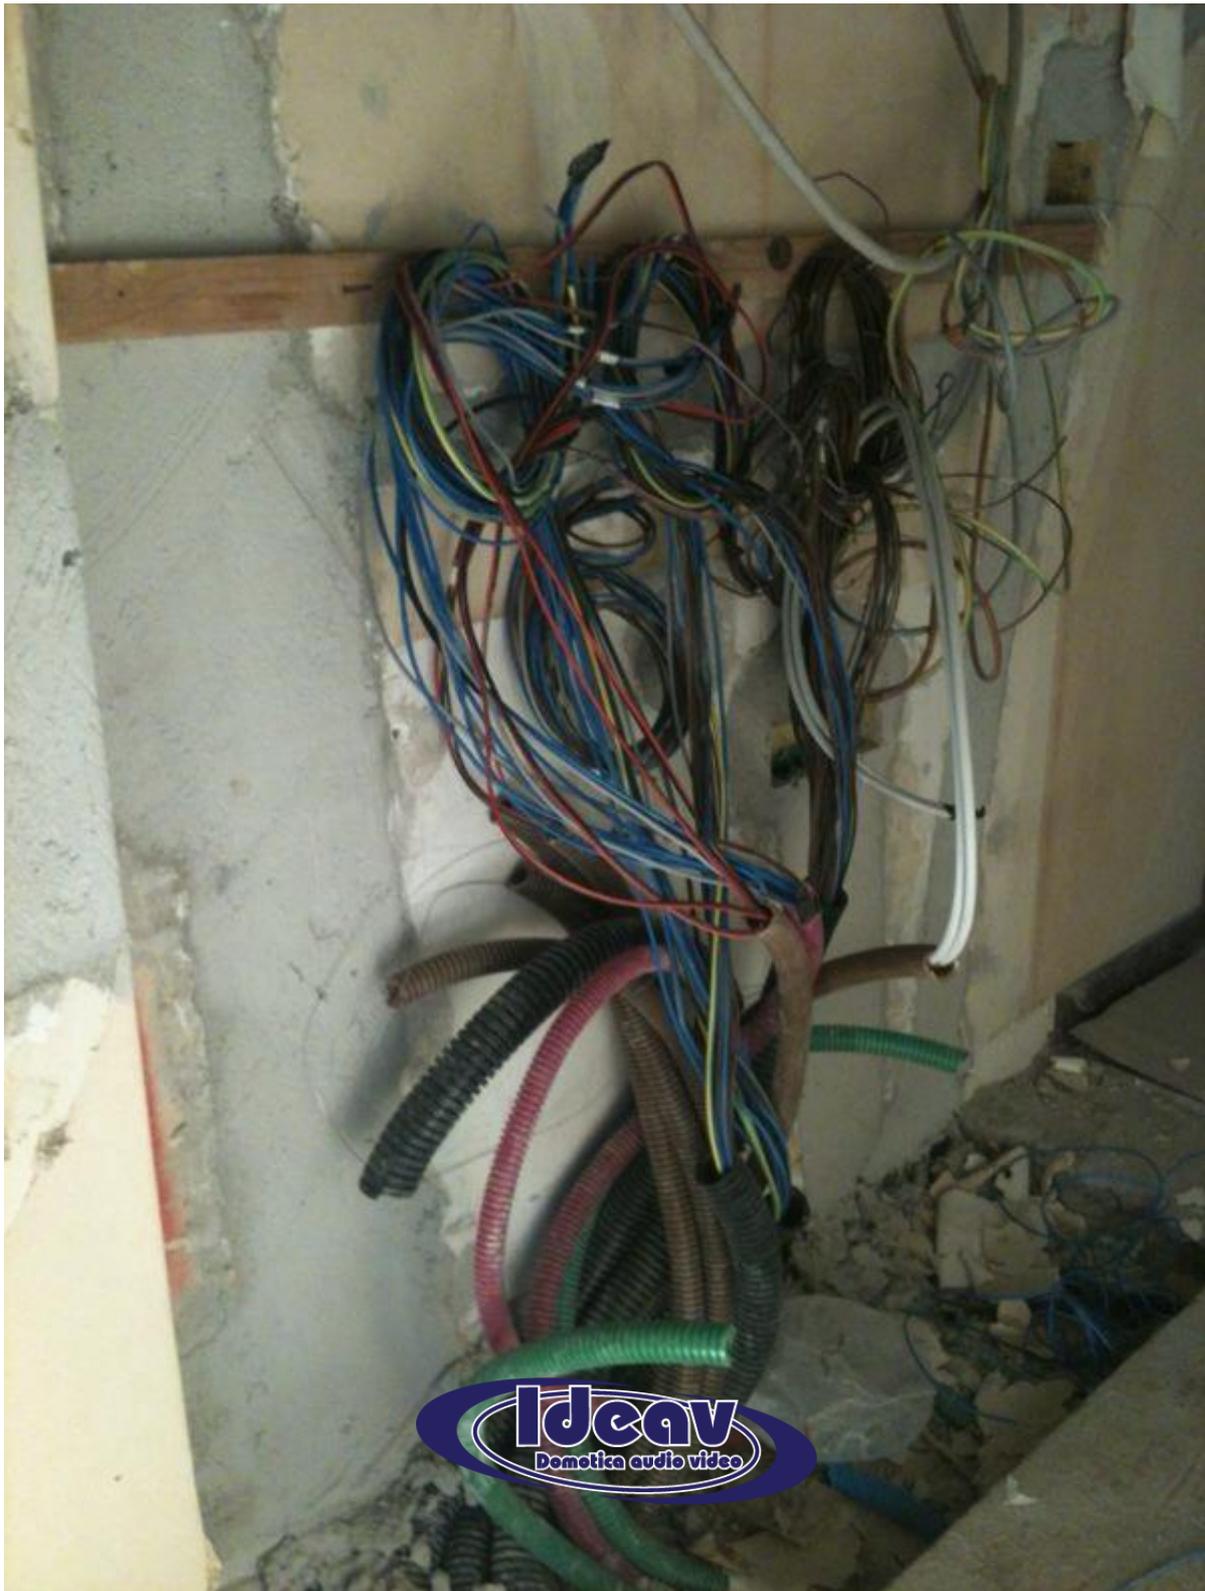

IDEAV SAS



IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV SAS							
Operaio 1			8	8	8		
Operaio 2							
Operaio 3			8	8	8		
Operaio 4			16	16	16		

NOTE	
------	--
